



erasmus+ ja
euroopa solidaarsus-
korpuse agentuur

Strateegilise koostöö projekti elluviimine



Ellen Vimberg
KA2 kick-off
kevad 2021

Mitu kuud on möödas, projekt tasub värske pilguga üle lugeda, et tuletada meelde:

- Mis on projekti eesmärk ja kuhu tahate jõuda?
- Milliseid soovitusi andsid eksperdid projekti tegevuste parandamiseks – ekspertide tagasiside on otsuskirja lisas
- Millised on kavandatud nn sisutegevused?
- Millised on kavandatud levitustegevused?
- Kuidas plaanite mõõta projektiga loodavat muutust (mõju)?

Leping ja lisad tuleb läbi lugeda-uurida, eriti eelarve – milliseid kärpeid on tehtud, kuidas see projekti elluviimist mõjutab. Kindlasti jagada seda infot ka partneritega.

Kui projekti eelarvet on kärbitud nii, et mõne tegevuse elluviimiseks pole üldse raha eraldatud, siis tuleb see ellu viia vastavalt ekspertide ettepanekutele või kasutades projektijuhtimise eelarverida.

Kui on kärbitud mobiilsuse eelarvet (projektikohtumine või õppimis- ja õpetamistegevus), siis tuleb see ellu viia vastavalt kärbetele.

Kui on kärbitud intellektuaalsete väljundite eelarvet, siis on tööpäevade arvu peetud ülepaisutatuks. Kärpest hoolimata tuleb projektitaotluses kirjeldatud väljundid ikkagi ellu viia.

A close-up photograph of a person's hand holding a smooth, grey, oval-shaped stone. The word "Cooperative" is written on the stone in a black, cursive script. The background is blurred, showing a person in a blue and pink patterned shirt and blue shoes.

Cooperative

Koordineeriva
asutuse
roll

- Projektimeeskonna loomine oma asutuse sees, sest üksi ei jaksa projekti vedada ja samal ajal sisu luua, levitustööd kavandada ja mõju mõõta
- Asutuse juhtkonna ja raamatupidamise kaasamine, et kõigil oleks ülevaade
- Projektist ja reeglitest endale tervikpildi loomine ning projekti juhtimine nii, et välispartnerid suhtuksid sellesse kui ühisesse asja (kontakti hoidmine, otsustesse kaasamine jms)

- Projekti dokumentatsiooni korrashoid
- Projektiga seotud muudatuste kooskõlastamine

NB! Palume alati viidata oma projektinumbrile

2020-1-EE01-KA227-ADU-093375

2020-1-EE01-KA20X-0XXXXX

- Aruandluskeskkonna Mobility Tool+ täitmine
- Vahearuanne ja lõpparuande koostamine ja esitamine läbi aruandluskeskkonna Mobility Tool+
- Projekti lõppedes tulemuste kandmine Erasmus+ projektitulemuste andmebaasi (*Project Results Platform*)

Projekti kohta infot jagades tuleb alati viidata
Euroopa Liidule kui projekti **kaasrahastajale**



Kaasrahastas
Euroopa Liidu programm
„Erasmus+”

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Koroonapandeemia ja juba pikalt kestnud piirangute tingimustes on koordineeriva asutuse (ja projekti juhtivate inimeste) üheks tähtsaks rolliks ka kogu rahvusvahelise projektimeeskonna moraali (tuju) ülevaheldamine, projektitöö tähtsaks osaks oleva inimliku (sotsiaalse) suhtluse võimaluste pakkumine õigel ajal, kohas ja mahus.

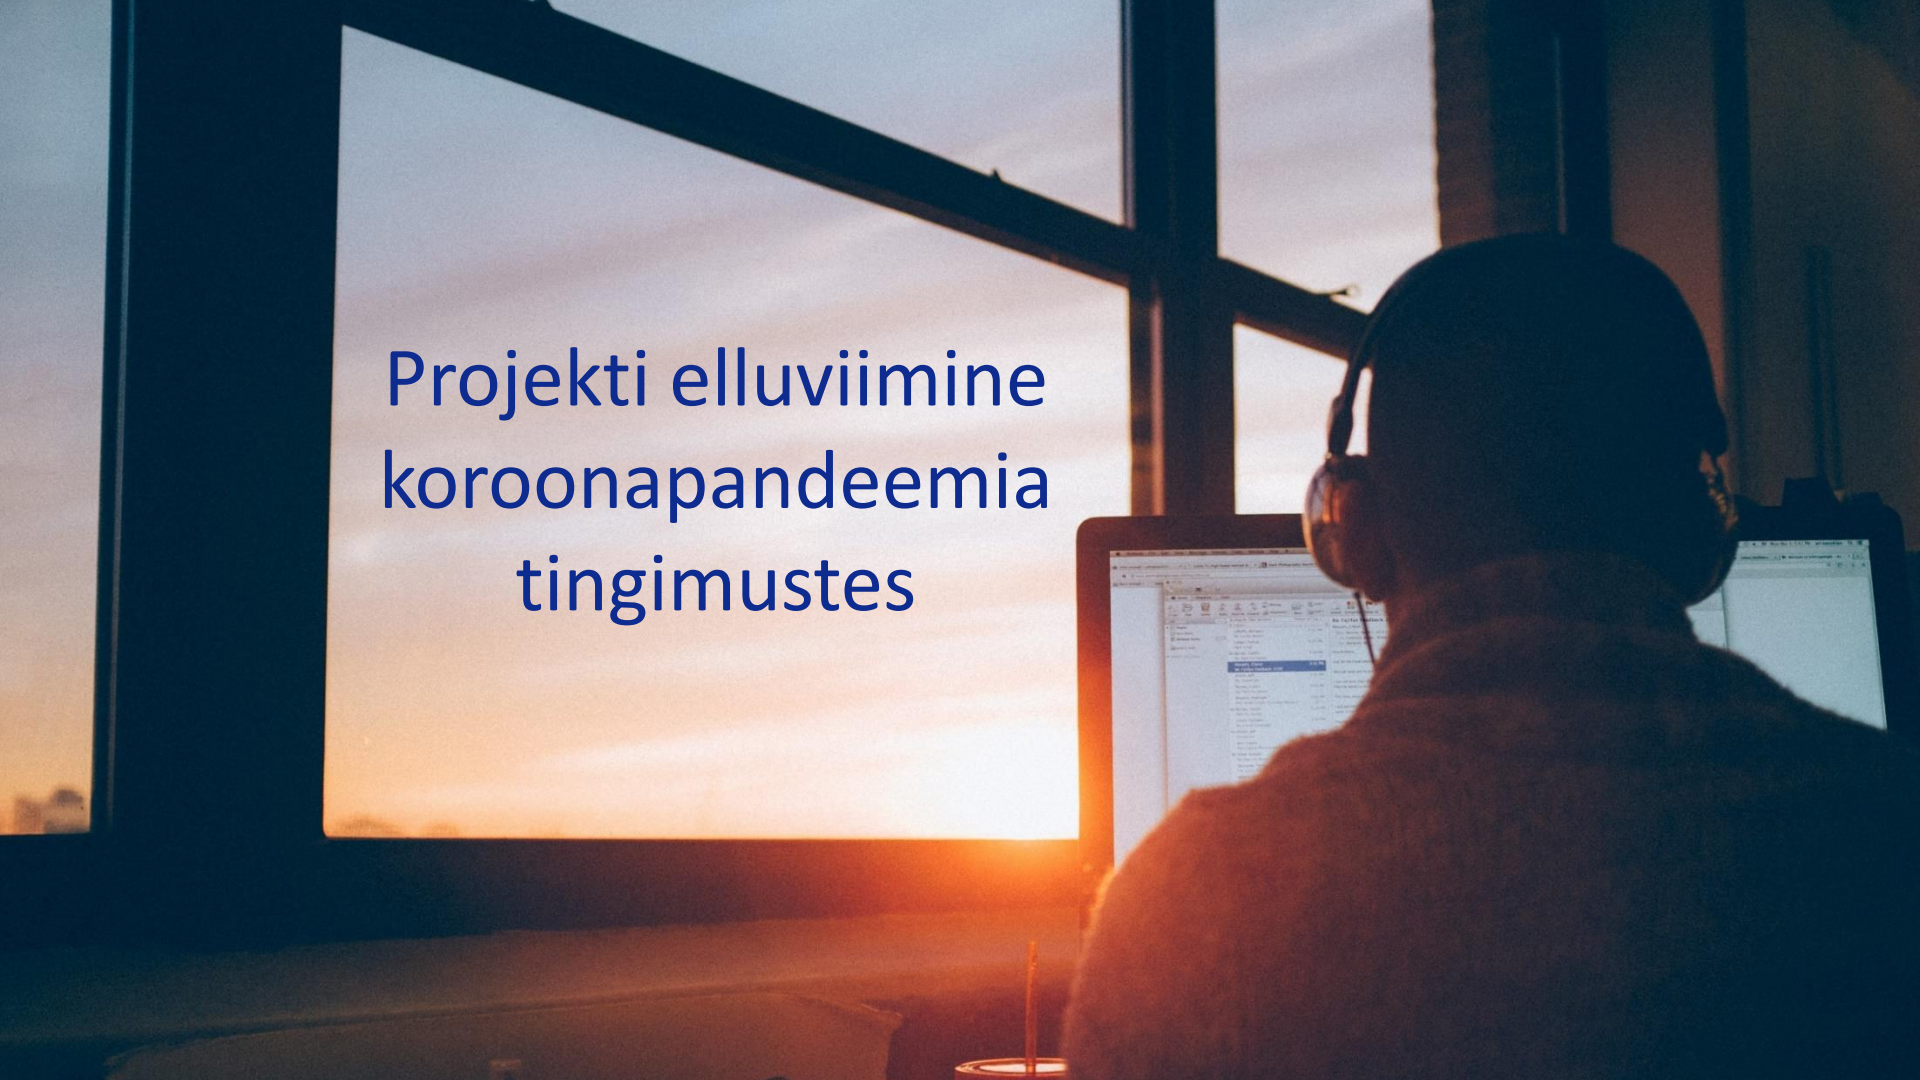




Esimene
projektikohtumine

- Partneritega koos kavandatud rollide ülevaatamine, vajadusel muudatustes kokkuleppimine, nii et iga partner teaks, mille eest ta vastutab
- Ajakava kooskõlastamine, vajadusel ajakohastamine
- Rahaülekannete ja kohustuslike lisadokumentide üleandmise korra kokkuleppimine
- Levitustegevuste ja mõju mõõtmise tegevuste kavandamine

NB! Soovitame tungivalt partneritega lepingu sõlmida, et kohustused ja õigused oleksid kirjalikult fikseeritud (lepingu näidis asub abimaterjalide lehel)

A person is seen from behind, wearing large headphones and working at a desk. They are looking at a computer monitor which displays a software interface with various panels and text. The room has large windows that look out onto a bright sunset or sunrise, with the sun low on the horizon, creating a warm, orange glow. The person's silhouette is dark against the bright light from the window.

Projekti elluviimine koroonapandeemia tingimustes

- Projekt tuleb ellu viia ka koroonaviiruse tingimustes, tehes vajalikke kohandusi (ja kooskõlastades need oma projekti lepingujärgse kontaktisikuga).
- Projekti algust ei ole võimalik edasi lükata selle ajani, mil reisimine võimalikuks muutub, projektitegevustega tuleb kohe pihta hakata, korraldades need ümber virtuaalseid vahendeid ja meetodeid kasutades.
- Euroopa Komisjon on soovitanud viia projektitegevus üle virtuaalkeskondadesse ning on selleks kõigile projektidele väljastanud *Addendumi*, mis sätestab virtuaalsetele tegevustele kehtivad reeglid (lähemalt rahastusreeglite ettekandes).

- Virtuaalseid tegevusi plaanides tuleb lähtuda projekti eesmärkidest, kavandades tegevused ümber nii, et eesmärgid saaksid võimalikult hästi täidetud ning tulemused (mõju) saavutatud.
- Julgustame mõtlema lennukalt, katsetama lähenemisi ja meetodeid, mida pole varem üritatud, sest maailm on muutunud, kaugõpe ehk distantsõpe on tulnud, selleks et jääda.
- Projekti eesmärkide saavutamiseks võib tarvis minna täiendavaid tegevusi (kas *online*'is või *offline*'is), oluline on kõigi partnerite otsustavus tegevused võimalikult hästi ellu viia.

- Virtuaalne projektikohtumine on muutunud tavapäraseks töömeetodiks, mis võimaldab projektile hoo sisse saada (ehkki esmakordselt koos töötavatele projektimeeskondade tuleks kasuks silmast-silma kohtumine).
- Juba käimasolevad projektid üritavad virtuaalseid projektikohtumisi korralda tavaolukorrast sagedamini, umbes kord kuus (vahel kohtutakse ka tihemini, vastavalt vajadusele), et meeskonnatunne ja koostöö ei kaoks.
- Virtuaalse levitusürituse puhul on oluline selle sisukus, miinimumpikkus on 1,5 tundi.

- Virtuaalsed õppimis- ja õpetamistegevused peavad kestma vastavalt tegevuse miinimumpikkusele (3 või 5 päeva), kestus vähemalt 3-4 tundi päevas.
- Projekti eesmärkide täitmise nimel on võimalik korraldada ka täiendavaid virtuaalseid õppimis- ja õpetamistegevusi.
- Võimalikud on ka nn hübriidüritused, kus osa osalejatest on kohapeal, osa osaleb virtuaalselt. Samas tasub kaaluda hübriidürituste kasutegurit, sest võib-olla aitab projekti eesmärkide saavutamisele paremini kaasa hoopis üritus, kus kõik osalejad on ühes kohas ehk virtuaalkeskonnas.

Füüsilise mobiilsuse planeerimine



Jälgige välisministeeriumi jooksvalt uuendatavat reisiinfot riikide kaupa (soovitused vältida reisimist teatud piirkondadesse):

<https://reisitargalt.vm.ee/>

Füüsiliste mobiilsuste (projektikohtumised, õppimis- ja õpetamistegevused) planeerimisel tuleb lisaks tervisekindlustusele (mis on **KOHUSTUSLIK!**) kindlasti sõlmida ka laiendatud reisitõrkekindlustus.

NB! Kindlustusseltsid pakuvad laiendatud reisitõrkekindlustust juhul, kui see on sõlmitud enne seda, kui sihtriiki reisimine välisministeeriumi poolt mittesoovituslikuks kuulutatakse.

NB! COVID-19 kattega tervisekindlustus kehtib ainult juhul, kui reis toimub riiki, kuhu välisministeerium reisimist ei keela või pole andnud soovitus seda vältida.

Kui kavandate praegu kohe mobiilsust nt suveperioodi, peate arvestama võimalusega, et see võib ära jääda.

Mida see projekti jaoks tähendab?

- Hetkel ei saa sõlmida COVID-19 kattega tervisekindlustust.
- Hetkel ei saa sõlmida laiendatud reisitõrkekindlustust.
- Kuna tegemist ei ole ettearvamatute asjaoludega (elame koroonapandeemia tingimustes juba pea aasta aega), siis ei laiene võimalikele kuludele väärarvatu jõu ehk *force majeure*'i säte ehk need kulud ei ole abikõlblikud.



Projektijuhi
infoallikad

- Projektitaotlus
- Leping ja selle lisad
- Erasmus+ koduleht

<http://haridus.archimedes.ee/2020-toetusesaajale>

Kui nende materjalide uurimine ei anna vastust põletavatele küsimustele, siis võtta ühendust oma lepingujärgse kontaktisikuga Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuris.

Eelistatud on kontaktivõtt e-kirja teel, sest suulised juhtnöörid on õigustühised.

NB! Palume alati viidata oma projektinumbrile!

Soovin edu
projektide
elluviimisel!

Tänan!



erasmus+ ja
euroopa solidaarsus-
korpuse agentuur
